

# 美濃屋川橋



所管支店	中部支店
工事名	令和4年度 23号中勢BP美濃屋川橋PC上部工事
発注者名	国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所
担当者	現場代理人：小出 陽一 監理技術者：富松 勇介
工事場所	三重県津市長岡町
工事概要	PC3径間連結プレテンション方式T桁橋

橋長：69.965m 支間長：22.162m+22.366m+22.452m

有効幅員：W1=8.0m（車道）、W2=3.0m（歩道） 主桁本数：プレテンション方式T桁 36本

## <現場位置図>



鈴鹿市から松阪市を結ぶ国道23号中勢バイパスのうち、美濃屋川に架かる橋梁です。

国道23号中勢バイパスの整備効果として、アクセス性の向上、交通環境の改善、地域の活性化等が期待されています。

工事進捗率は、6月15日時点で58.8%です。

## <現場全景>



## <当日の作業内容>

- 床版・横組工
- 型枠組立
- 鉄筋組立

結果報告

<休憩所の様子>



休憩所内は、片づけ、清掃がしっかり行われていて、清潔感がありました。快適に使用することができます。工事概要がわかる掲示物等も掲示されています！



休憩所には熱中対策緊急キットや、タブレットなどのグッズが設置され、熱中症対策がしっかりとられていました。作業員の方も空調服を取り入れていました！



入口付近に救急箱が設置されており、表示はしっかりされていましたが、LEDが置かれ、取り出しにくくなっていましたので、片づけをお願いします。AEDについても、使用方法の掲示物はありませんでしたが、現物がわかりにくいので、わかりやすいところに設置するといいですね。



<現場および現場周辺の様子>

吸い殻入れに、切ったペットボトルに水を溜めたものが設置されていて、火を確実に消してから捨てるようになっていました。

火災防止の工夫が見られます！


発注者からの事故事例の掲示物やWBGTチェック表が掲示されていました。

休憩時間を利用して確認することができるので、日頃から災害防止や熱中症対策に対しての意識を高めることができているですね！

綺麗に清掃されています！隣が一般道ですが、目隠しもしっかりされていますし、普段は施錠され、鍵も事務所で管理されているので、女性は安心して利用できます！



現場の手前の道路脇にイメージアップ看板がありました。地域の方にとってどんな工事なのか分かりやすく伝えることができているですね。周辺の草刈りをしていただけるとさらにイメージアップです。

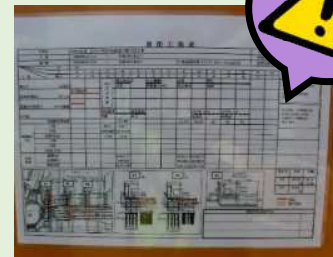

安全掲示板は見栄え良く掲示されていました。工事月間工程表、週間工程表が前月のままだったので最新版に更新をお願いします！



玉掛けワイヤー置き場や倉庫内は整理整頓が行き届いていました。産廃ボックスは飛散防止ネットが張られ、分別がしっかりされていました。



これからも引き続き、整理整頓をお願いします！



場内は4色のカラーコーンを使い分けて、視覚的にわかりやすく作業区域を明示できていました。



開口部は赤のカラーコーンで分かりやすく注意喚起され、緑のカラーコーンで安全通路がしっかり確保されていました。また橋面にある資材にも、ネットが張られ飛散しないようになっていました。すぐ隣が一般道なので、飛散養生が徹底されていてとてもいいですね！



重機の旋回範囲は黄色のカラーコーンで囲われています。

資材置き場は青色のカラーコーンでわかりやすく仕切られています。資材置き場においても、整理整頓がばっちりです！





橋面や桁下に細かな鉄くずと木くずが落ちていました。

交通量も多く風も強い場所なので、飛散しないように片づけをお願いします。



移動式梯子を上った先に、資材が置かれていました。

吊足場への昇降整備の為、設置場所の変更をお願いします。



<パトロール状況>



工事名 行方不明の乗用車捜索のため工事  
 工種 安全管理  
 拠点  
 市和野町員庫  
 店社家業パトロール  
 女性パトロール隊  
 株式会社 安部日鋼工業

<今回のパトロールメンバー>

横山・平田・岡田

以上、FLOWERSからの報告でした。
