

第2小和沢橋



所管支店	中部支店
工事名	平成27年度 新丸山ダム井尻八百津線第2小和沢橋PC上部工事
工事場所	岐阜県可児郡御嵩町小和沢 地内
工事概要	工期：平成27年10月22日～平成29年2月28日（工期延長）

構造形式：2径間連続ラーメンPC箱桁橋 橋長：L=117.000m 桁長：L=116.400m
 支間長：65.000m+50.000m 有効幅員：8.00m 荷重：B活荷重
 縦断勾配：7.0%～1.03% 横断勾配：4.6%～1.5%

<現場位置図>



A部拡大図



『第2小和沢橋』は、新丸山ダム建設に伴い、通行ができなくなる県道358号井尻八百津線（小和沢橋）の付替道路建設工事です。

平成28年2月12日にFLOWERS初めての安全パトロールをしてから、今回で2度目、約4ヶ月半ぶりの安全パトロールとなります。

当初工期は平成28年10月14日までの予定でしたが、平成29年2月末まで工期延長となりました。

<現在の状況>



<当日の作業内容>

- ・張出し施工03BL 鉄筋・PC・型枠組立て
- ・張出し施工02BL 仕上げ



結果報告

<休憩室の様子>



前回のパトロールで「救急箱」の設置場所が分かりにくいという指摘がありました、とてもわかりやすくなりましたね！

標示も文字だけでなくイラスト付きでより目立って良いと思います☆

もちろん中身も充実していました。

エアコンが効いていて
休憩スペースとして
過ごしやすい環境でした♪



物が乱雑に置かれていることもなく、
きちんと整理できていました！

<現場および現場周辺の様子>

パトロール中に頂いたお菓子たち。
中には塩タブレットや飴がたくさんありました。

現場に常備されており、誰でも気軽に手に取れて
熱中症対策ができていいですね☆

これから更に暑い日々が続きますので
しっかり水分をとりながら必要な分だけ食べるようにしましょう！





ミストが出る扇風機が置いてありました。

こちら現場の気温を抑えることができ
熱中症対策として有効ですね♪

6月16日に行われた高校生に向けての
現場見学会の時にも活躍していました！



現場の外には地域の方に向けた
掲示板が設置されていました！

工事の進捗率がそれぞれグラフや写真で
確認できて、現在どこまで作業が進んで
いるのか、この現場がどんな工事をして
いるのか、情報発信されています。

発注者である新丸山ダム工事事務所
の方が作られたものです！

安部日鋼工業社員の似顔絵付き！
とてもユニークで
印象がいいですね★





現場の敷地に入るところの安全通路の前に『ヒヤリハットマップ』がありました！初めて現場を訪れた人でもこれを見れば危険箇所がわかる親切なマップとなっています。

前回に引き続き、安全掲示板もばっちりです！



作業場では気温が表示される電光掲示板が設置されていました！リアルタイムで気温が映し出されるので暑さへ注意が向きますね☆

また、ウォータークーラーが用意されており、現場で作業をする方も水分補給がしやすい環境が整っています。

熱中症対策への意識がとても高いです！





単管が出て危ない所には赤色のテープが巻かれており、目立つよう注意喚起がなされ工夫されていました。



桁内が薄暗かったので早めに照明を設置すると良いですね。




単管に青いクッション材が巻かれていました！もし不意に当たっても衝撃が吸収されるので怪我防止にもなりますね♪



傾斜があるところに置かれた機材にはしっかりと滑り止めが。細かい配慮がみられます。



前方型枠横梁付近の足場の段差に隙間があったので、ここにも幅木を設置すると良いでしょう。

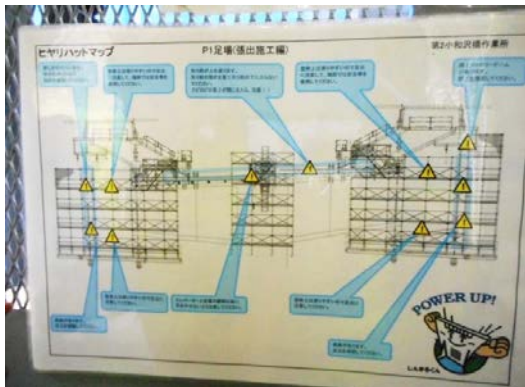

エレベーター内にはたくさんの掲示物がありました。使う頻度も多いと思うのでよく目に入ります！足場の『ヒヤリハットマップ』もありました！



単管バリケードにキャラクターが用いられていました★



現場のイメージも明るくなりますね！

<パトロールの様子>



<今回のパトロールメンバー>
河合・岡田・横山



以上、FLOWERSからの報告でした。
