

小津奈木第2橋



所管支店	九州支店
工事名	熊本3号小津奈木第2橋上部工（P7～A2）工事
工事場所	熊本県水俣市大迫地先
工事概要	工期：平成28年1月16日～平成29年3月31日

橋梁型式：PC4径間連続ラーメン箱桁橋 橋長：184.5m
 支間長：36.1m+61.0m+55.0m+30.6m 有効幅員：9.51m
 主桁重量：3982.5t 主桁本数：1本

<現場位置図>



南九州西回り自動車道芦北出水道路の一環である小津奈木第2橋のうち、P7～A2間上部工の施工を行う「小津奈木第2橋」で安全パトロールを行ってきました。

平成28年3月10日以来、2回目のパトロールとなります。今回は進捗率80%以上、完工まであと少しです！

<現場全景>



<当日の作業内容>

- ・ P7側径間 : 型枠解体
- ・ P9張出施工 : 6BL
鉄筋・PC・型枠組立
- ・ A2橋台 : ウイング、パラペット
コンクリート打設

結果報告

<現場事務所の様子>



現場事務所入口正面の棚に設置された救急箱。とても見つけやすいです！



分かりやすい表示があると誰にでも見つけやすく、より良いです。



前回パトロール改善事項「ゴミ箱の設置」「トイレの目隠し設置」は、しっかり継続されており、水回りも清潔な状態でした！



休憩所の掲示物を最新に変えましょう！ →

↓ (事務所の掲示物は最新でした。)



<現場および現場周辺の様子>



←「喫煙所の表示」「消火器の設置」に加えて、
消火器が直射日光や雨風にさらされないよう
鉄箱による防護処置がされていました。

万が一の時、
素早く消火活動が行えます！

火元責任者の表示もされています。→




見やすい安全関連の掲示物がたくさん！

危険箇所が分かりやすく、
安全にパトロールする事ができました。
普段作業をされている方も、
危険箇所の再確認ができますね。



釘が散乱していました。
その場で片付けていただきましたが、
思わぬ怪我に繋がります。
作業終了後、
すぐ清掃するようにしましょう！






手すりに衣類が掛けられている箇所、
単管に工具やペットボトルが差してある箇所、
たくさん見受けられました。



手すりの高さ85 cm以上・・・ばっちりです！

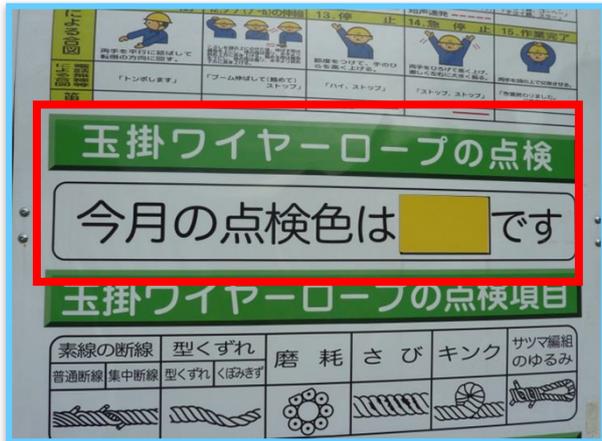

2月の玉掛ワイヤー点検色は「黄色」・・・ しっかり点検されています！

<パトロール状況>



エレベータで作業場へ向かいます！

下から見ても
 かなりの高さ、
 ドキドキです！



工期も残り後わずか！
 そんなお忙しい時期にも関わらず、
 丁寧に説明していただき、
 とても分かりやすかったです。

大変だとは思いますが、
 こんな時期だからこそ
 再度、安全確認をしていただき
 「無事故」「無災害」を！！

<今回のパトロールメンバー>

(岐阜本社) 三輪・河合 (九州支店) 藤吉・川原

以上、FLOWERSからの報告でした。
