

# 赤木橋

ABEせーふてい  
FLOWERS

所管支店	九州支店
工事名	東九州道（清武～北郷）赤木橋上部工工事
工事場所	宮崎県宮崎市大字鏡洲地先
工事概要	工期：平成28年3月11日～平成30年3月30日（延長予定）
橋梁型式：PC4径間連続ラーメン箱桁橋 橋長：371m	
支間長：73.40m+2@111.00+73.40m 有効幅員：12.01m	
主桁重量：主桁生コン4600m <sup>3</sup> 主桁本数：1本（箱桁1室） 施工範囲：上部工本体、壁高欄	

## <現場位置図>



※国土地理院の電子地形図に現場情報を追記して掲載

今回のパトロール現場は、国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所発注の「赤木橋」です。

昨年の8月以来、2回目のパトロールです。

## <現場全景>



## <当日の作業内容>

- ◇P1橋脚
  - ・1OBL 型枠・鉄筋・PC組立て
- ◇P2橋脚
  - ・P2-P3 中央閉合部 型枠解体
- ◇P3橋脚
  - ・A2側 乗入支保工組立

結果報告

<現場事務所の様子>



靴箱のすぐ傍に、ほうきとちりとりが置いてありました。すぐに掃除できて良いですね！



打合せ机にはお花が置いてありました。心が和み、良い打合せができそうです。



掲示物は、7月から始まった今期のものになっていました。前回のパトロールの指摘事項、「掲示物を最新の物に張り替える」が継続されています。



「てげ暑いぞ！宮崎」(てげ=宮崎の方言で「とても」という意味) 事務所にも熱中症への喚起がしっかりしてありました。





事務所の水回りもとてもキレイでした。  
ゴミの分別もしっかりされていました。



事務所に入ってすぐの所に  
カギをかける専用の場所がありました。  
きちんと管理されていて素晴らしいです。



女性用のトイレが設置されていました。  
清掃用具も設置してあり、とてもキレイでした。



<現場および現場周辺の様子>



パトロール当日（9月21日）は  
全国労働衛生週間の準備期間  
でした。  
スローガンが現場の見やすい  
場所に掲示してありました。



橋面の資機材は非常に整理整頓されていて、とても気持ちよかったです。  
まさに「直角平行」でした！



倉庫内も整えられていて、  
カッパなどを干す竿もありました。



入口に泥落としがあり、  
倉庫内がキレイに  
保てますね。




消火器が各所に設置してあり、火災への対策がされていました。



雨や直射日光を避けるために、屋外用の箱に入れるとより良いと思います。



消火器が単管に針金で止められているものがありました。  
転倒防止にはなりますが、万一の際にすぐ使えるようにしておいてください。

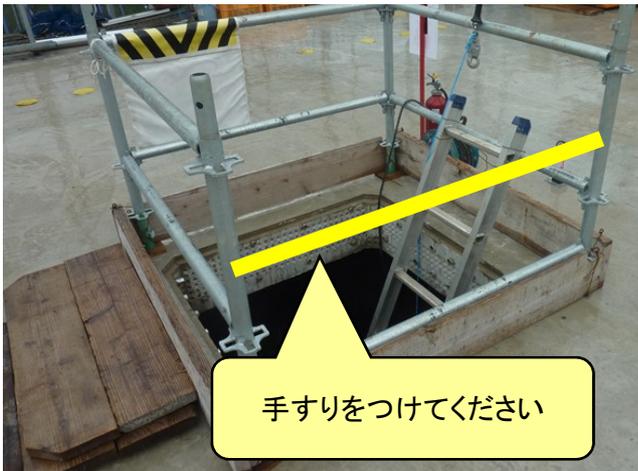

手すりをつけてください




箱桁内に入る開口部に手すりを設置してください。

ハシゴを降りる人が簡単に開閉できる手すりだと良いですね。

足場内の昇降階段の上に大きく開いている所がありました。  
人や工具の転落防止対策をお願いします。



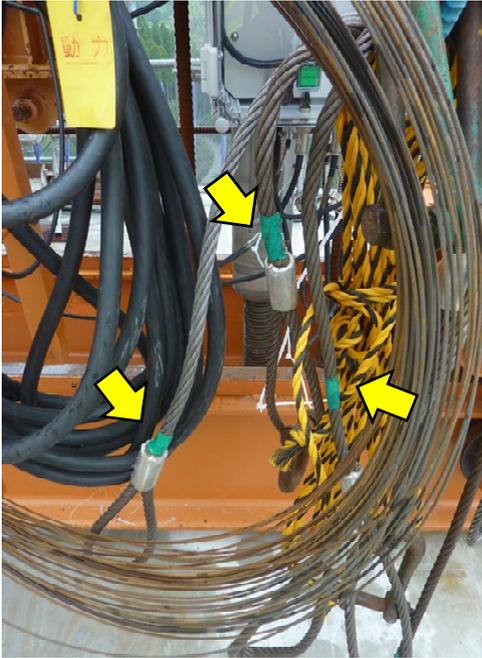

玉掛ワイヤー点検色			
緑	1月	5月	9月
黄	2月	6月	10月
赤	3月	7月	11月
	4月	8月	12月

毎日が点検日!

玉掛ワイヤーの点検はしっかりされていました。  
「毎日が点検日！」  
とても良い心がけですね。

橋面のフォークリフトにも  
きちんと輪止めがしてありました。



休憩に入る時、通路に鉄筋を置いたままでした。  
歩く妨げにならないところに置いてから  
休憩に入ってください。




フックの外れ止めが破損した  
レバーブロックが足場内にありました。  
間違えて使用しない様に撤去  
してください。





クレーンの回りの立入禁止措置も  
しっかりされていました。

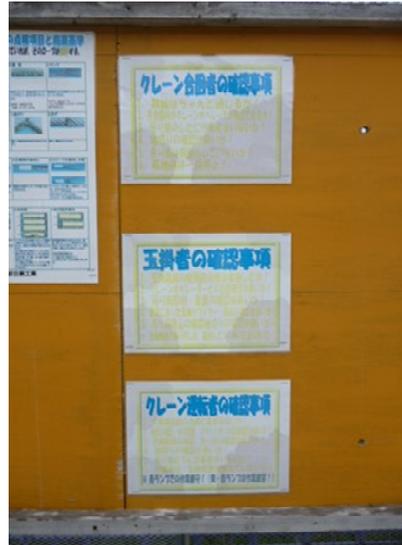

現場にクレーンに関する確認事項が掲示してあり良かったです。  
ただし、文字が日に焼けて読みづらくなっていたので、  
新しく作り直してください。



<パトロール状況>



箱桁内も点検しました！  
照明が設置してあり、  
明るさは十分でした。



<今回のパトロールメンバー>  
左から 柳原、河合（岐阜本社）、廣中（九州支店）

工事最盛期のため、機材や材料は多かったですが、整理整頓が非常に行き届いていました。

広い現場なので、職員・協力業者の方もたくさんいらっしゃると思いますが、今後もコミュニケーションを密にとりつつ、完工まで事故なく作業してください。

ご安全に！

以上、FLOWERSからの報告でした。
