

○安全衛生パトロール点検結果報告書○

平成31年3月13日(水)実施

名二環新政成2西床版
名二環新政成3西床版



所管支店	中部支店
工事名	平成30年度 名二環新政成2高架橋西床版工事 平成30年度 名二環新政成3高架橋西床版工事
発注者名	国土交通省 中部地方整備局 愛知国道事務所
工事場所	愛知県海部郡飛島村新政成
工事概要	

<新政成2西床版> 工期：平成30年6月15日～平成31年6月3日

鋼4径間連続少数主桁橋（プレキャストPC床版 1,830m²）橋長：202.000m 有効幅員：8.875m

<新政成3西床版> 工期：平成30年7月19日～平成31年6月25日

鋼4径間連続少数主桁橋（プレキャストPC床版 2,120m²）橋長：189.500m 有効幅員：16.209m～8.875m

<現場位置図>



今回の現場は、名古屋環状2号線の一部区間にある新政成2高架橋西床版工事と新政成3高架橋西床版工事です。

名古屋環状2号線は名古屋市外周を通り、名古屋国道302号の渋滞緩和・物流の効率化・災害時の緊急輸送道路の確保が期待されています。

パトロール時の進捗率は、新政成2高架橋：73.8%、新政成3高架橋：79.1%でした。

<現場全景>



<当日の作業内容>

■新政成2西床版

- P208場所打ち床版 型枠・鉄筋組立
- P206-P208間詰めコンクリート打設準備
- P206-P208無収縮モルタル打設準備

■新政成3西床版

- P208-P209 高さボルト撤去、無収縮モルタル打設、打設準備 P212 鉄筋、PC組立て
- P208 型枠組立て
- P209-路肩側 朝顔、防護修正

結果報告

新政成2高架橋西床版

<現場事務所の様子>



物が散乱することなく
きれいに使用されて
いました！




消火器や救急箱は、
入口付近に設置され、
わかりやすく表示されています。



事務所の外に
喫煙所が設置され
分煙されています。

<現場および現場周辺の様子>

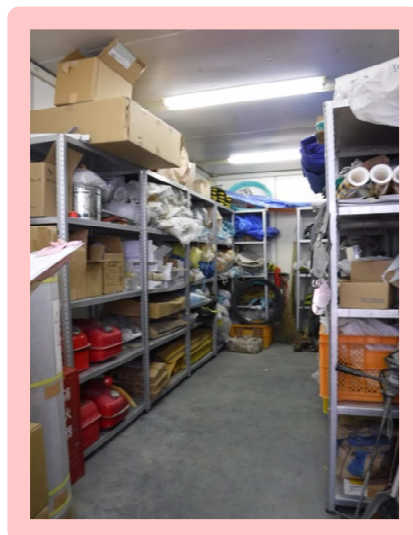

倉庫内も整理整頓が
行き届いていました。
物を探す手間がなくなり
業務の効率化に
繋がりますね。



廃棄物はしっかり分別され
飛散防止ネットも
張られています。



事務所の隣に、単管を利用して
作られた防護具置き場が
ありました。きれいな事務所を
保つことができますね。



安全通路がしっかり確保されています！



昇降階段には夜間作業時に照明器具が設置されていました。暗い中でも安全に作業が進められます。



橋面の資材はカラーコーンを使って整理整頓されていました。転がりそうな鉄筋は、番線等で縛っておくといいですね。

新政成3高架橋西床版

<現場事務所の様子>



こちらの現場の事務所もきれいに使用されていました！



救急箱が設置されていませんでした。血圧計もわかりにくいところに設置されていたので、使いやすい場所に設置し、表示をお願いします！

<現場および現場周辺の様子>



現場周辺は、資材置き場がカラーコーンで仕切られ整理整頓されていました。

トイレも一般道側には、目隠しが設置されていました。



こちらの現場にも保護具置き場がありました。
防護具がきれいに片付けられています。

「現場設備配置図」が掲示されていました。

どこに何があるか、新規入場者はひと目で
わかっていいですね！



一人ひとりの安全スローガンに加え、趣味や
ニックネームなどが書かれた掲示物がありました。

現場の明るい雰囲気が伝わってきます！



開口部が1箇所ずつしっかり
養生され、安全通路が確保されていました。



橋面に吊り籠を置く際は、橋面にサビがつかないように、木の板を敷くといいですね。

<パトロール状況>



新政成2高架橋も新政成3高架橋も全体的に整理整頓が徹底されとてもきれいな現場でした。

寒暖差も激しい季節ですので、体調管理に気をつけてください。

ご安全に！

<今回のパトロールメンバー>

横山・岡田

以上、FLOWERSからの報告でした。
