

松浦8号橋



所管支店	九州支店
工事名	長崎497号 松浦8号橋上部工（下り線）工事
発注者名	国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所
担当者	現場代理人：弓指 和文 監理技術者：佐々木 純 担当：吉田 大嗣、野田 津、坂本 茉奈美
工事場所	長崎県松浦市御厨町地先
工事概要	工期：令和3年9月18日～令和5年3月20日
構造形式：5径間連結ポステンT桁橋 橋長：202.000m	
支間長：38.960m+39.700m+38.699m+38.698m+37.942m 有効幅員：9.25m	

<現場位置図>



本工事は、一般国道497号、西九州自動車道の松浦佐々道路事業の一環である橋梁上部工工事を新設する工事です。

現場は長閑な農村部での施工です。作業場は比較的広い敷地面積を有していますが、県道や市道及び農道を跨いでの施工箇所があるため、綿密な交通管理計画と架設計画を立案し、特に第三者に対する安全に関して留意する必要があります。

進捗率は69.5%（6月末）です。

<現場全景>



【当日の作業内容】

- P1-P2 軌条組み立て
- A1-P1 架設準備
- P2-A2 吊り足場・防護組立
- 場内資機材整理

結果報告

<現場事務所の様子>



◎現場事務所内はきれいに整理されて
いました。机の上もきれいで、ゴミの
分別もしっかり行われていました。



◎救急箱、AED、熱中症
対策キットが入口付近の見
やすい場所にまとめて設置
されていました。緊急時に
すぐ見つけることで出来ま
すし、分かりやすくてとて
も良いですね！



<現場および現場周辺の様子>

🌀現場周辺

倉庫



◎倉庫の中もきれいに整頓されています！
日頃から整理整頓への意識が高いことが窺
えますね！

掲示物

◎熱中症対策、いじめ・ハラスメント対策、
感染症予防等の掲示物がありました！様々
な種類の掲示物があって良いですね！



休憩所



◎感染症対策として、個人それぞれのコップが置ける、コップ置き場が設置されていました！
コップ置き場には番号が書かれており、間違えて他の方の物を飲まないようになっていますね！

◎休憩所の近くのベンチは、ソーシャルディスタンスを保つために隣り合って座ることのないよう対策がされていました！感染症対策をしっかりとされていますね！



×休憩所③の入り口に救急箱の表記がありました、救急箱の付近に表記がなく、救急箱の場所が分かりにくくなっています。救急箱付近にも表記があると分かりやすくて良いですね！

現場

安全通路

◎通路が狭くなっていますが、その中でも整理整頓がされており、とてもきれいな現場でした！




◎安全通路には、板や安全カバーが敷かれており、とても安心感のある通路でした！



×安全通路の一部に、安全カバーの下にワイヤーが通っているところがあります。気づかなかった場合、転倒の恐れがあるので、付近に「足元注意」等の表記があると尚良いですね！



◎単管が飛び出している部分にはすべて保護キャップがついており、注意の表記もされていました！道路上の表記もあり、その部分には物が置かれておらず、第三者への配慮が感じられました！

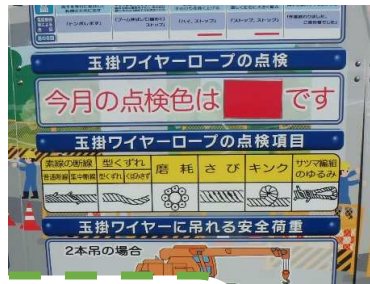

◎今月の玉掛ワイヤーの点検色は赤
 でした！玉掛ワイヤーはまとめて置
 かれており、赤のテープがついてい
 ました！
 しっかり点検・管理されています！

<パトロール状況>



安全面・衛生面ともに意識の高い現場で、とても安心してパトロールをすることが出来ました。
 施工場所が一般道を跨いでいることもあり、第三者への配慮として材料置き場や通路の整理整頓
 が行き届いていると感じました。
 お忙しい中、ご対応くださりありがとうございました。完工まで無事故・無災害でご安全に！

<今回のパトロールメンバー>
 山口・小森・石樽

以上、FLOWERSからの報告でした。
