

○安全衛生パトロール点検結果報告書○

令和7年4月16日（水）実施

北小松高架橋P22-A2



所管支店	大阪支店
工事名	小松拡幅北小松高架橋（P22-A2）PC上部工事
発注者名	国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所
担当者	現場代理人：住友 一貴 監理技術者：岡 春良 担当：羽原 裕貴、中村 優也
工事場所	滋賀県大津市北小松地先
工事概要	当初工期：令和6年3月1日～令和7年6月30日 変更工期：～令和7年7月30日

構造形式：ポステンション5径間連続中空床版橋 橋長：150.391m 桁長：149.641m
 全幅員：10.500m 有効幅員：9.610m 支間長：23.729m+31.794m+31.289m+31.289m+30.040m
 活荷重：B荷重 斜角：90° 00' 00" 平面線形：R=450m 縦断勾配：\0.141～\0.991% 横断勾配：6.000%

<現場位置図>



当工事は、国道161号の交通混雑の緩和、現道狭隘区間の解消及び冬季の円滑な交通確保を目的とした、バイパス及び現道拡幅事業です。

現場は琵琶湖から近く、天気がいいと琵琶湖が眺められる場所にあります！

工事の進捗は4月16日時点で97.7%でした。

<現場全景>



<当日の作業内容>

- ・橋面、壁高欄仕上げ
- ・P22-P26径間 L側桁カバー下地材取付

結果報告

＜現場事務所の様子＞

現場事務所の扉にも
AED設置の掲示があり外
からも設置場所がわかり
やすいです！



救急箱、AED、熱中症対策用品は現場事務所の入口に置かれ、
設置場所の表示もわかりやすく掲示されています。


事務所内




AED消耗品の交換忘れ
れが防げますね。

4月でしたがすでに熱中症対策用品が準備されていました。
気温上昇時も安心です。
熱中症者への応急処置方法もあり誰でも対応できますね。

火元責任者の表示と
消火器が設置されていました。

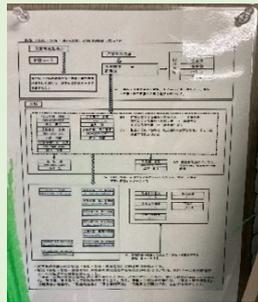

緊急連絡先の掲示に
より、連絡先が明確で
す！

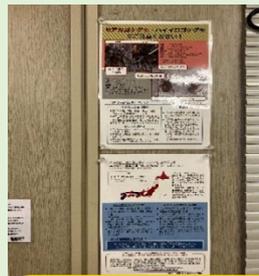

セアカゴケグモ、ハイ
イロゴケグモの情報
がありました。誤ってさ
わる危険が防げます。

分別できるようゴミの
種類ごとにゴミ箱が設
置されていました。



男性用トイレ入口



女性用トイレ入口



女性用トイレ内部



トイレの入口は男性用と女性用が反対側に設けられていて
気を遣うことなく使用できます。
トイレ内も設備が整えられとても綺麗でした！

<現場および現場周辺の様子>

事務所前に情報が整頓して掲示されているため一目瞭然です。





一人KY重点「行動目標」が掲示され、作業員の方それぞれの安全目標が確認できます！

事務所の外にも緊急連絡先の掲示があり、緊急時迅速に対応できますね。



カラーコーンや資材置場、玉掛けワイヤー、清掃用具などそれぞれの保管場所が明確になっています。整理整頓に対する意識が高まりますね！

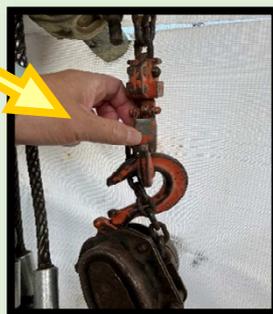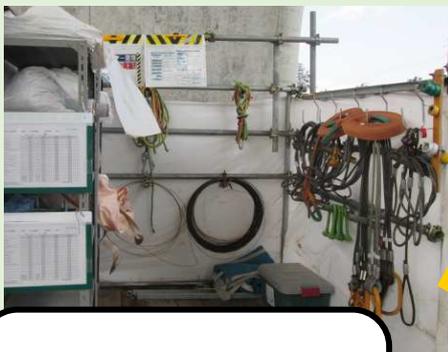

壊れた道具は間違えて使用しないように、使用できる道具と別の場所で管理するよう努めてください。



橋面上

フォークリフトのタイヤを白にして、橋面が汚れないよう配慮されていました!




現場に上がる昇降階段前にマットが設置されて橋面が汚れないよう配慮されていました。



フォークリフトはしっかり車止めブロックが設置されていました。



橋面上は綺麗な状態が保たれていました。細長い跡がありますが、雪の多い地域のため雪から橋面を保護するシートがかけられていた跡だそうです。

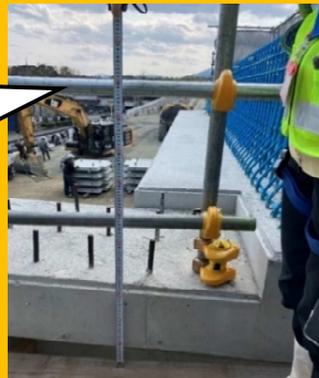

手すりの高さは床面に段差がある場合、高い位置から90cm確保するようにしてください。



ネットの紐が垂れ下がっているので、綺麗に結び直してください。

一般車の目に映る場所は、普段より一層丁寧に管理されるとなお良いと思います。



ゴミ置き場はゴミの種類ごとに設置されていました。また混合廃棄物は対象となるものの表が掲示され迷うことなく捨てられますね!



ゴミ置き場



飛散防止ネットもしっかりかけられています。





風が強い現場なので昇降階段を補強しているそうです。



昇降階段も風の強さに配慮して2列が採用されたそうです。安定感があり安心して上り下りできました。また高さも十分にあり屈むことなく通ることができました。

「吹き流しの状態と風速の目安の表」が掲示されています。

現場内は安全喚起の掲示が多数ありました。



一般道路上の箇所には落下防止ネットが設置されていました。

<パトロール状況>



工事名 小松坂橋北小松渡架橋 IP22-A2)PC 上部工事
 工種 安全管理
 測点
 令和7年4月度
 本社パトロール
 (FLOWERS)
 株式会社 安部日鋼工業



工事名 小松坂橋北小松渡架橋 IP22-A2)PC 上部工事
 工種 安全管理
 測点
 令和7年4月度
 本社パトロール
 (FLOWERS)
 株式会社 安部日鋼工業

お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。とても綺麗な現場で、整理整頓が行き届いていました。現場を綺麗に保つ工夫や気象条件、安全対策など多方面にわたり細やかな気遣いを感じました。これから気温が高くなっていきますので体調管理に気をつけて無事故無災害でご安全に！



<今回のパトロールメンバー> 清水・石樽・升田・志水 以上、FLOWERSからの報告でした。
